

## Протокол № 6/18

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Качканарского городского округа» на 2018-2022 годы  
в 2018 году

Администрация  
Качканарского городского округа

27 сентября 2018 года  
16-00 час.

Присутствовали 15 членов комиссии из 19  
(4 члена комиссии отсутствовали по уважительной причине):

Председательствующий:

Заместитель главы администрации городского округа по городскому хозяйству

- В.А. Саракаев

Члены Комиссии:

Представители исполнительной власти ОМС

- О.В. Адамчук  
- С.П. Боголюбова  
- В.А. Перепечина  
- С.А. Скутина  
- М.И. Титовец  
- Р.А. Гимадиев  
- С.Г. Габышева  
- Ю.А. Прокурова  
- В.С. Прилуцкая  
- Ю.Н. Бячков

отраслевые (функциональные) органы  
исполнительной власти ОМС

Представители законодательной власти,  
общественных движений, бизнеса

- Е.В. Беляева  
- А.А. Попов  
- К.В. Денисов  
- И.А. Стрыков  
- СМИ

Приглашенные:

Кворум имеется.

### Повестка дня:

1. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Качканарского городского округа» на 2018-2022 годы в 2018 году по состоянию на 27 сентября 2018 г.

2. Ознакомление членов Комиссии с условиями участия муниципалитетов в конкурсе проектов благоустройства малых городов.

### Ход заседания:

**По первому вопросу повестки дня слушали В.А. Саракаева:**

Вячеслав Андреевич ознакомил членов комиссии и приглашенных с текущим состоянием дел по реализации проекта по состоянию на 27 сентября 2018 г.

По состоянию на 27 сентября 2018 г. процент выполнения работ по объекту не увеличился, хотя завершение работ по контракту с ООО «Капитал Строй» должно было осуществиться 15 сентября. Невыполнение мероприятий подрядчик объясняет отсутствием оборотных средств.

Заказчиком работ денежные средства переведены подрядчику за установку малых архитектурных форм, которые действительно установлены, на днях ассигнования поступят на счет, и работы будут продолжены.

Основным недостатком невыполнения работ является асфальтирование дорожек, выполнение данного вида работ зависит от погодных условий.

Подрядчик гарантирует выполнение работ без установления конкретной даты.

В связи с этим переносится дата торжественного открытия объекта с 5 октября на более поздний срок, но эта дата наступит.

**По второму вопросу повестки дня слушали В.А. Саракаева и С.П. Боголюбову:**

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в течение последних двух лет проводится конкурс проектов малых городов и исторических поселений. Возможно, такой конкурс продолжится в последующие годы, поэтому нам нужно подготовиться к этому моменту.

Участие в конкурсе очень заманчиво, при признании проекта победителем, на реализацию проекта выделяются приличные средства.

Намерения участвовать в таком конкурсе у Администрации городского округа есть, даже есть идея благоустроить весь 10 микрорайон. Но выбор общественной территории, на которой будет реализовываться проект, принадлежит жителям городского округа.

Проект должен быть насыщенным, с учетом создания комфортной среды проживания от дошкольников до жителей старшего поколения.

#### **Обменявшись в ходе заседания мнениями, комиссия решила**

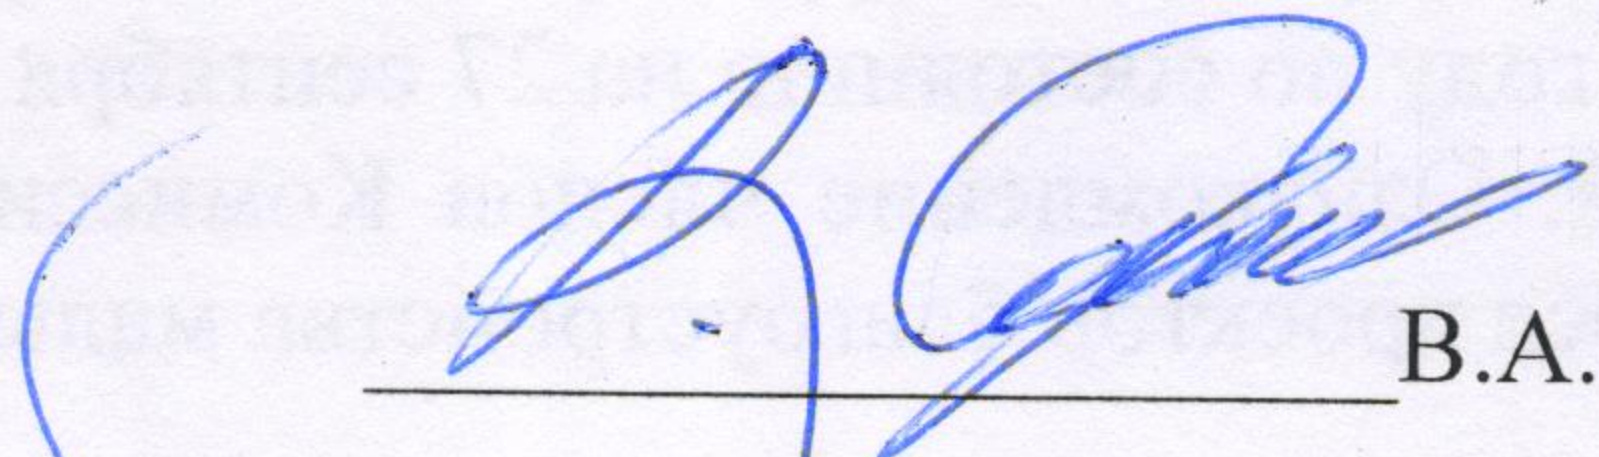
1. Принудить подрядчика в соответствии с действующим законодательством завершить работы в 2018 году в срок до 01 ноября.

2. При оплате работ учесть все неустойки в соответствии с действующим законодательством.

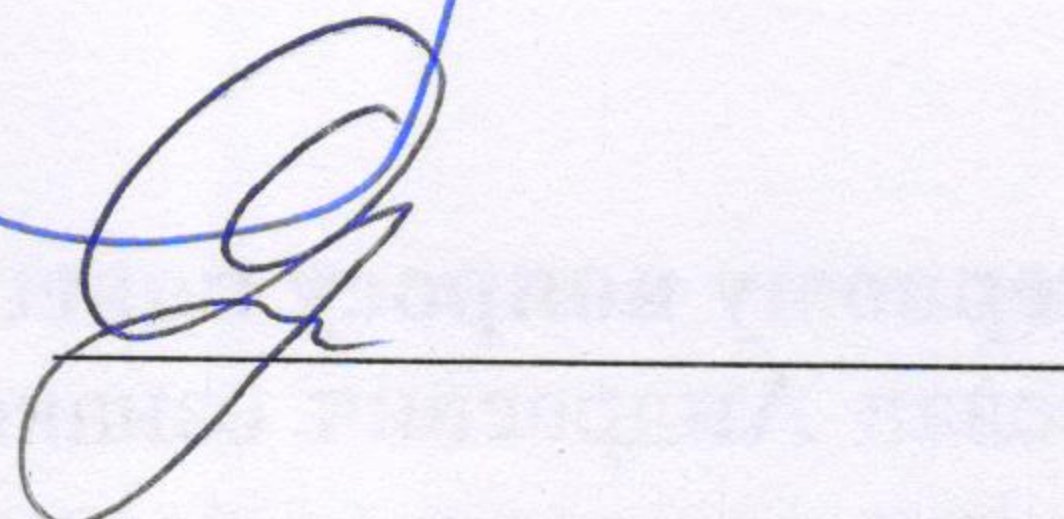
3. Дату торжественного открытия перенести на реальный срок.

4. Создать рабочую группу из специалистов отдела по экономике и стратегическому развитию, отдела по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям, отдела городского хозяйства, транспорта и связи, на которую возложить обязанности по подготовке мероприятий по участию в конкурсе проектов благоустройства малых городов.

Председатель комиссии:

  
В.А. Саракаев

Секретарь комиссии:

  
С.А. Скутина
